

ЗВІТ 4 ІЗ 5

Рoadмапа впровадження

Виконуваний маршрут А→Б: три хвили за 9 місяців, перша — по тижнях.
46 задач із власниками в межах реальної ємності команди, 12 ризиків із
мітигаціями, 6 контрольних точок, формула гарантії КТ-2 і окрема лінія
автономності власника.

9 сторінок · Гант 12×9 · ресурсна модель · ризики · гарантія · автономність

ЗМІСТ ЗВІТУ


ГЛАВА	НАЗВА – І ЩО ВОНА ДАЄ	СТОР.
4.01	Хвилі (вікна з перекриттям) та Гант із датами й виконавцями · W1 по тижнях · mermaid/Excel-експорт	3–4
4.02	Беклог 46 задач · ресурсна модель без перевантажень · рішення по РМ	5
4.03	План перших 90 днів · вимірні цілі дня 90 з YoY-нормалізацією	6
4.04	Реєстр 12 ризиків з мітигаціями · 6 КТ · формула гарантії КТ-2 з винятками	7–8
4.05	Лінія автономності: політики → власники → тест 3 тижнів → шлях до 3 місяців	9

ГЛАВА 4.01 · ХВИЛІ ТА ГАНТ А→Б · 1/2

Спершу прилади. Потім двигуни. Потім система і масштаб.

ХВИЛЯ (ВІКНА ПЕРЕКРИВАЮТЬСЯ – КАНОН)	ПРИНЦИП	DoD ХВИЛІ ЦІЛКОМ
W1 · дні 0-30 (01.09-30.09)	чесне вимірювання + зупинка прямих втрат	GA4 ≤5% · бій ≤0.7% на тесті · бренд <10% платних · розпродаж запущено
W2 · дні 21-120 (21.09-29.12) — старт до фінішу W1	двигуни грошей: CRM, mobile, наявність, дашборд	CR і repeat ростуть проти baseline; дашборд у ритмі ≥3 тижні
W3 · дні 105-270 (14.12-29.05)	система і масштаб: SEO, орг, PL-поріг	канали/ринки проходять поріг юніт-економіки; DoD-чекліст 3.05

Гант: 12 задач-плейбуків · вісь — реальні дати · у кожній виконавець

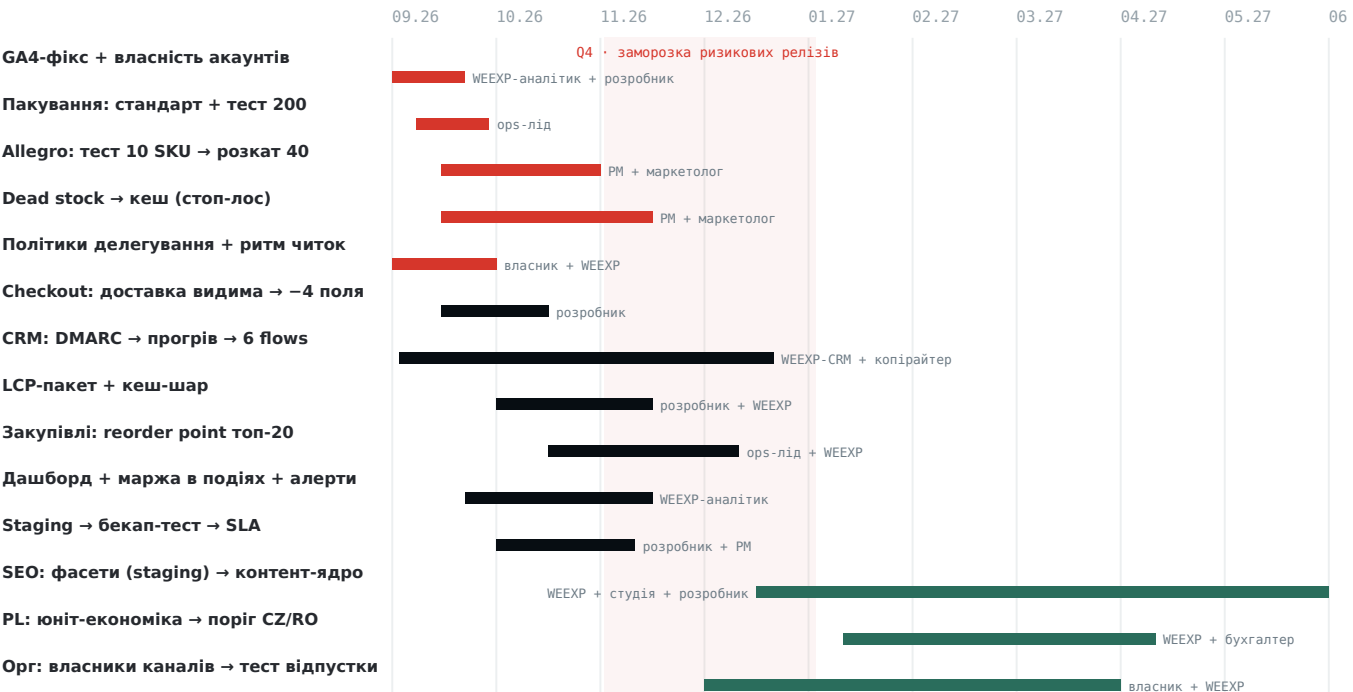

Кожен рядок = плейбук програми: строк (вікно на осі) · виконавець (підпис) · бюджет-вікно хвилі (Звіт 5) · вимірний DoD (таблиця беклогу 4.02). Перекриття хвиль – свідоме: W2-роботи (копірайт flows, staging) стартують, поки W1 закривається. Q4-заморозка ризикових релізів: 01.11–31.12 (штрихована зона).

```
Канонічний експорт (mermaid, фрагмент – повний у робочих матеріалах + Excel-лист «Гант (план)»):
gantt · dateFormat YYYY-MM-DD · axisFormat %m.%y
section Хвиля 1 · GA4-фікс і власність :2026-09-01, 21d · Пакування (тест 200) :2026-09-08, 21d · Allegro тест цін 10 SKU :2026-09-15, 14d
section Хвиля 2 · CRM flows з прогрівом :2026-09-21, 75d · LCP-пакет :2026-10-01, 45d · Дашборд щотижневий :2026-10-15, 30d
section Хвиля 3 · SEO фасети+контент :2026-12-14, 120d · PL юніт-економіка :2027-01-10, 90d · Тест відпустки :2027-02-15, 21d
```

ГЛАВА 4.01 · ХВИЛЯ 1 ПО ТИЖНЯХ · 2 / 2

Хвиля 1 по тижнях (розробник — рівно 40 год, без перевантаження)

тиж.	РОЗРОБНИК (ГОД)	WEEXP / КОМАНДА	ВИДИМИЙ РЕЗУЛЬТАТ ТИЖНЯ
1	server-side purchase, ч.1 (10)	кікоф · власність GA4 → компанія · DMARC r=pone · PMax бренд-виключення · політики знижок — драфт	брендові кліки падають уже в п'ятницю
2	purchase ч.2 + дедуплікація (6) · Consent Mode v2 (8)	стандарт пакування розроблено · Allegro: беззбитковість 40 SKU порахована · план розпродажу dead stock	нова схема пакування в тест (200 відпр.)
3	доставка+строк на PDP і в кошику (12)	звірка GA4↔бекенд (14 дн, старт) · Allegro: тест цін на 10 SKU · читка №3 · W2-старт: копірайт кошик-flow	доставка видима ДО оформлення
4	строк над fold на PDP (4)	політики делегування підписані · розпродаж запущено · тест пакування: заміри · КТ-1	КТ-1: чесний GA4 ≤5% · бій ≤0.7% на тесті · бренд <10%

Разом розробник у W1: 40 год — рівно місячна ємність підрядника. Checkout -4 поля (14 год) і бекап-тест (6 год) — свідомо в тижнях 5–6 (W2): пріоритет W1 — вимірювання і видимість доставки. Тиждень 3 показує перекриття хвиль: W2-копірайт стартує до фінішу W1.

Залежності, які тримають графік

ЩО	ЧЕКАЄ НА	РИЗИК ЗРИВУ
CRM-flows (з дня 21)	DMARC (день 3) — інакше листи в спам	низький — 3 год роботи
Дашборд (день 45)	GA4-фікс (день 21) + маржа в подіях (день 60)	середній — залежить від розробника
Закупівлі Q4 (день 90–120)	кеш із dead stock: ≥€40k до дня 75	середній — темп розпродажу (ризик R3)
SEO-фасети (день 105+, на staging)	staging (день 50); HE в сезон — тому після 14.12 підготовка, розкат січень	низький
CZ/RO-рішення (КТ-4, M7)	PL LTV:CAC ≥2.5 — інакше HE виходимо	це фіча, не баг: захист від передчасного масштабу

ГЛАВА 4.02 · БЕКЛОГ ІЗ ВЛАСНИКАМИ ТА РЕСУРСНА МОДЕЛЬ

46 задач. Жодного власника з навантаженням понад ємність.

Ресурсна модель по місяцях (год/міс проти ємності)

РОЛЬ	ЄМНІСТЬ	M1	M2	M3	M4	M5-9 СЕР.	ПРИМІТКА
Розробник (підрядник)	40	40	38	36	30	24	жодного місяця понад 40
PM «Тестик» (fulltime)	160	120	130	120	110	100	резерв 20-30% на операційку
Маркетолог (25% на проект)	40	18	30	34	30	26	пік — креативна матриця M2-3
Ops-лід	30	24	16	20	26	12	пік — пакування M1, закупівлі M4
Контентник	60	8	20	28	30	40	атрибутика → контент-ядро
WEEXP (аналітик + CRO/CRM, part-time)	64	58	62	60	54	48	у бюджеті €6k/міс
Копірайтер (новий, з M2)	24	—	20	22	16	10	≈€400/міс — погоджено у Звіті 5

Про РМ з дня 1: найм РМ триває 4–6 тижнів. Рішення: перший місяць роль РМ тримає WEEXP-фасилітатор (у межах пакета) паралельно з наймом; передача ролі — на тижні 5–6 із дводенним оверлапом. Це знімає ризик R2 (реєстр нижче).

Верх беклогу W2 (18 задач — головні 10)

ЗАДАЧА	ВЛАСНИК	ГОД	КРИТЕРІЙ «ЗРОБЛЕНО»
Checkout: –4 поля + автозаповнення (тижні 5–6)	розробник	14	completion ≥52% до дня 90
Бекап: тест відновлення на staging (тиж. 6)	розробник	6	протокол відновлення
Кинутий кошик: 3 листи + SMS	WEEXP-CRM + копірайтер	16	≥7% повернених кошиків
Після-продажний цикл (догляд)	WEEXP-CRM + маркетолог	16	2-га ≤90 дн: 9→12%
Реактивація з прогрівом (15%/тиж, стоп-правило)	WEEXP-CRM	12	скарги <0.2%
LCP-пакет: WebP+CDN+критичний CSS+GTM-ревізія	розробник + WEEXP	30	LCP ≤3.0s (CrUX 28 дн)
Reorder point + safety stock топ-20	ops-лід + WEEXP	16	OOS ≤10% в місяць запуску
Щотижневий дашбورد (виручка/маржа/CAC/repeat)	WEEXP-аналітик	20	основа читок 3 тижні поспіль
Staging + чеклист релізу	розробник	10	релізи через staging
Собівартість по SKU → ABC v2 → прайс-тест ядра	бухгалтер + WEEXP	16	тест +5% на 30 SKU проведено

ГЛАВА 4.03 · ПЛАН ПЕРШИХ 90 ДНІВ

Три спринти: полагодити, запустити, виміряти.

СПРИНТ	ГОЛОВНЕ	ЩО БАЧИТЬ ВЛАСНИК НАПРИКІНЦІ
1 · дні 1-30 «Прилади і кровотечі»	потижневий план — гл. 4.01. GA4-фікс, DMARC, пакування, Allegro-тест, доставка видима, розпродаж запущено, політики підписані	КТ-1: чесні дані · бій ≤0.7% на тесті · бренд <10% платних · перший кеш із dead stock
2 · дні 31-60 «Двигуни»	checkout-поля · кошик-flow · після-продажний flow · LCP-пакет ч.1 · staging · RFM-сегменти · прогрів бази	перші повернені кошики в дашборді · LCP-тренд вниз · сегментні розсилки
3 · дні 61-90 «Виміряти і показати»	реактивація · маржа в подіях · дашборд v1 у ритмі · reorder point · NPS-запуск · BLIK · schema-зірки топ-40	КТ-2: переоблік матриці + перерахунок €433k за фактами

День 90 — вимірні цілі (не обіцянки)

МЕТРИКА	ДЕНЬ 0	ЦІЛЬ Д.90	ДЖЕРЕЛО	ЯК НОРМАЛІЗУЄМО СЕЗОН (Y0Y)
Розбіжність GA4 ↔ бекенд	22%	≤5%	щотижнева звірка	не сезонна — абсолют
Checkout completion	43.6%	≥52%	GA4 (чесний)	порівняння з тим самим міс. торік ±2 п.п.
Бій у доставці	2.1%	≤0.9%	перевізники	% від відправлень — сезон не впливає
LCP mobile	4.6s	≤3.5s	CrUX 28 дн	не сезонна — абсолют
Виручка з CRM	4.8%	≥8%	бекенд+UTM	частка виручки — самонормалізується
Кеш із dead stock	€0	≥€40k	каса	абсолют, разовий
Allegro contribution	3%	≥6%	юніт-звіт каналу	частка — самонормалізується
Брендові кліки в платному	31%	<10%	search terms	частка — самонормалізується
Рішень на власнику / тиждень	≈14	≤7	журнал читок	не сезонна

Ефект 90 днів у грошах: ≈€17k contribution кумулятивно + ≥€40k кешу (крива окупності — Звіт 3, гл. 3.04; прибуткова окупність — М4–М5, і ми кажемо це прямо). Ритм: читка щотижня 45 хв; власник — перші 4, далі раз на 2 тижні; SLA рішень власника — 48 год.

ГЛАВА 4.04 · РЕЄСТР РИЗИКІВ ВПРОВАДЖЕННЯ · 1/2

12 ризиків, які можуть з’їсти план. У кожного — мітигація і тригер плану Б.

#	РИЗИК	ЙМОВ. / ВПЛИВ	МІТИГАЦІЯ	ТРИГЕР ПЛАНУ Б
R1	Розробник (bus-factor 1) випадає	сер. / крит.	SLA + документація ядра (W2); другий підрядник «на підхваті» з M3 (4 год/міс знайомства з кодом)	простій >5 роб. днів → підхват переймає
R2	PM не найнято вчасно	сер. / вис.	WEEXP тримає роль M1 (гл. 4.02); найм стартує до кікофу	немає кандидата до тижня 4 → продовження опції на M2 (без зміни бюджету)
R3	Розпродаж dead stock повільніший за план	сер. / сер.	черги зі стоп-лосом; канали: сайт- аутлет + Allegro-акції; переоцінка щотижня	<€25k за 45 дн → Q4-закупівлі частково в кредитну лінію (погодити з банком заздалегідь, W1)
R4	Реактивація бази палить домен	низ. / вис.	прогрів 15%/тиж зі стоп-правилом (скарги >0.2%)	спам-інциденти → пауза 2 тижні + окремий IP/субдомен
R5	Allegro: підняття цін валить обсяг	сер. / сер.	тест на 10 SKU 2 тижні ДО розкату; моніторинг позицій Smart!	обсяг →>15% → відкат цін, важіль через логістику
R6	Сезон з’їдає ops-ліда (M4–5)	вис. / сер.	його задачі W2 сплановані на M2–3; M4–5 — лише контроль правил	перевантаження → перенесення другого постачальника на M6
R7	Consent-фікс знизить видиму конверсію	вис. / низ.	очікувано: пояснено в дашборді приміткою; рішення — по бекенду	— (не ризик грошей, ризик паніки — знятий комунікацією)
R8	Каса Q4: закупівлі проти графіка проекту	сер. / вис.	план каси W2 (d01); дорогі роботи не плануються на вересень-жовтень	розрив >€20k → пауза W3-витрат на 1 міс (заморозка узгоджена наперед)
R9	Клієнт не надає дані/ доступи вчасно	сер. / вис.	чекліст доступів підписується на кікофі з датами; PM веде трекер «чекаємо від клієнта»	блокер >5 роб. днів → задача зсувається, дедлайн КТ переноситься письмово (не «мовчазний» зрив)
R10	SLA рішень власника 48 год не тримається	сер. / вис.	читка фіксує прострочені рішення; ескалаційна карта (гл. 4.05); частину рішень закривають політики	3 тижні поспіль >2 прострочень → розмова про делегування цієї категорії рішень достроково
R11	Вето співзасновниці на PDP/контент-зміни	сер. / сер.	вона в С-ролі W2-рішень від початку (гл. 2.01); зміни показуються на макетах ДО релізу	вето на ключовий блок → A/B-тест як арбітр: рішення за цифрами, не за смаком
R12	Відмова від нових підрядників (копірайтер/студія)	низ. / сер.	тендерний блок 0 у Ганті: бриф → шортлист 3 → тестове → договір; бюджет-стеля у Звіті 5	жоден кандидат не пройшов → WEEXP закриває обсяг тимчасово за тим самим бюджетом

Ймовірність/вплив переглядаються на кожній КТ; нові ризики додаються з номером, жоден не видаляється — лише закривається зі статусом.

6 контрольних точок. І гарантія, порахована формулою.

КТ	КОЛИ	ЩО ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ	РІШЕННЯ
КТ-1	день 30	GA4 ≤5% · бій ≤0.7% тест · бренд <10% · розпродаж запущено	старт W2 / корекція
КТ-2	день 90	9 метрик дня 90 (гл. 4.03) + переоблік матриці	гарантійна розвилка — формула нижче
КТ-2.5	день 150	CRM/LCP-ефекти виміряні · OOS-правила діють · дашборд у ритмі	рішення про масштабування реклами
КТ-3	день 180	повний контур W2 · роль аналітика (найм/аутсорс)	старт орг-циклу 2
КТ-4	M7	PL: CAC проти маржі 1-го замовлення (payback ≤1) · тест відпустки пройдено	go/no-go CZ/RO
КТ-5	M9	DoD-чекліст повністю (Звіт 3, гл. 3.05)	передача системи + план року 2

Формула гарантії КТ-2 — без дрібного шрифту

РЕЗУЛЬТАТ НА ДЕНЬ 90	ПРАВИЛО	ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ У ГРОШАХ
≥7 із 9 метрик дня 90 досягнуто	КТ-2 пройдено — програма йде далі за планом	оплата M4 за графіком
5-6 із 9	M4 — half-rate (50%), план W2 коригується письмово; повторний замір день 120	—€3.0k ризику на боці WEEXP
≤4 із 9	M4 не оплачується взагалі — працюємо місяць за свій рахунок до проходження	—€6.0k повністю на боці WEEXP

Винятки (не рахуються у «недосягнуто»): метрика заблокована з вини замовника, зафіксованої у трекері R9/R10 (доступ не надано >5 роб. днів; рішення власника прострочене >7 днів; вето R11 без A/B-арбітражу) — така метрика виключається зі знаменника: було 9 → рахуємо з тих, що були в наших руках. **Приймання:** кожна метрика міряється джерелом зі своєї таблиці (бекенд клієнта — первинний; GA4 — лише після проходження звірки ≤5%); сезонність — колонка YoY-нормалізації в гл. 4.03. Спірні виміри — третій замір разом, протокол підписується обома сторонами.

Чому ми на це готові: 7 із 9 метрик дня 90 — інженерні (звірка, DMARC, LCP, бій, розпродаж), їх результат залежить від виконання, не від ринку. Ризик формули для WEEXP реальний, але керований — саме тому гарантія чесна, а не маркетингова.

ГЛАВА 4.05 · ЛІНІЯ АВТОНОМНОСТІ ВЛАСНИКА (ПРІОРИТЕТ №2 З АНКЕТИ)

Від «все стане» — до трьох тижнів, а далі до трьох місяців.

Це не побажання, а окрема лінія плану з власними етапами, метриками і тестом. Мета-фраза власника: «бізнес не потребує мене щодня». Розкладаємо на 4 етапи:

ЕТАП	ЩО ПЕРЕДАЄТЬСЯ	ІНСТРУМЕНТ	МЕТРИКА
1 · M1-2: Політики	знижки (з contribution-правилом), креативи (в межах бренд-рамки), закупівлі В/С-груп	підписані політики + журнал винятків	рішень на власнику: 14 → ≤7/тиж
2 · M3-5: Власники каналів	CRM → маркетолог · OTIF/склад → ops-лід · воронка → PM · P&L-ритм → бухгалтер+PM	KPI в дашборді + щотижнева читка без власника (він читає протокол)	4 власники з KPI ≥2 міс поспіль
3 · M6-7: Тест 3 тижнів	власник офлайн 3 тижні (свідомо ДО сезону, не в M8)	ескалаційна карта: що і до кого; WEEXP — арбітр процесу, не рішень	жодна метрика дашборда не падає >5%; рішення «через океан» ≤2
4 · M9-15: До трьох місяців	цикл 2: делегування цін ядра і Q-планування; наймання/розвиток заступника	річний операційний план + квартальні цілі	3 місяці — реальний горизонт року 2, і ми кажемо це чесно

RACI цільовий (фрагмент — повний у робочому трекері)

РІШЕННЯ / ПРОЦЕС	R (РОБИТЬ)	A (ВІДПОВІДАЄ)	C (РАДИТЬСЯ)	I (ЗНАЄ)
Знижка в межах правила	маркетолог	маркетолог	—	власник (журнал)
Знижка поза правилом	маркетолог	власник	WEEXP	PM
Закупівля А-групи	ops-лід	власник (до M5) → ops-лід (після)	бухгалтер	PM
Релізи сайту	розробник	PM	WEEXP	команда
Ціни ядра	WEEXP-аналіз	власник (весь рік 1)	маркетолог	—

Зв’язок з історією: 4 минулі ініціативи вмерли без власника метрики і ритму (гл. 2.01). Лінія автономності — це той самий механізм, відбудований свідомо: політики → власники → ритм → тест. Кожен етап видно в дашборді, зриви — на читках, а не постфактум.
